




HYDROGÉOTECHNIQUE CENTRE

Ingénierie géotechnique, géologique, hydrogéologique et hydrologique
appliquée aux bâtiments, génie-civil, infrastructures et à l'environnement
Sondages - Essais de sols in situ et en laboratoire

Dossier	C.21.10410
Lieu	CLERMAIN - SAINTE CECILE (71)
Projet	RCEA - Mise à 2x2 voies
Suivi piézométrique	
Sondage	PZ1
Ouvrage	Bassin PI VC2
X	1 824 193.01
Y	6 132 742.19
Z TN	268.48
Z CAPOT	269.43
Z REGARD	268.74

DATE	EAU (m/capot)	EAU (mNGF)	FOND (m/capot)	FOND (mNGF)
05/01/2022	2.25	267.18	10.20	259.23
19/01/2022	2.02	267.41	10.20	259.23
03/02/2022	1.85	267.58	10.20	259.23
16/02/2022	1.98	267.45	10.20	259.23
03/03/2022	1.74	267.69	10.20	259.23
17/03/2022	1.73	267.70	10.20	259.23
28/03/2022	1.58	267.85	10.20	259.23

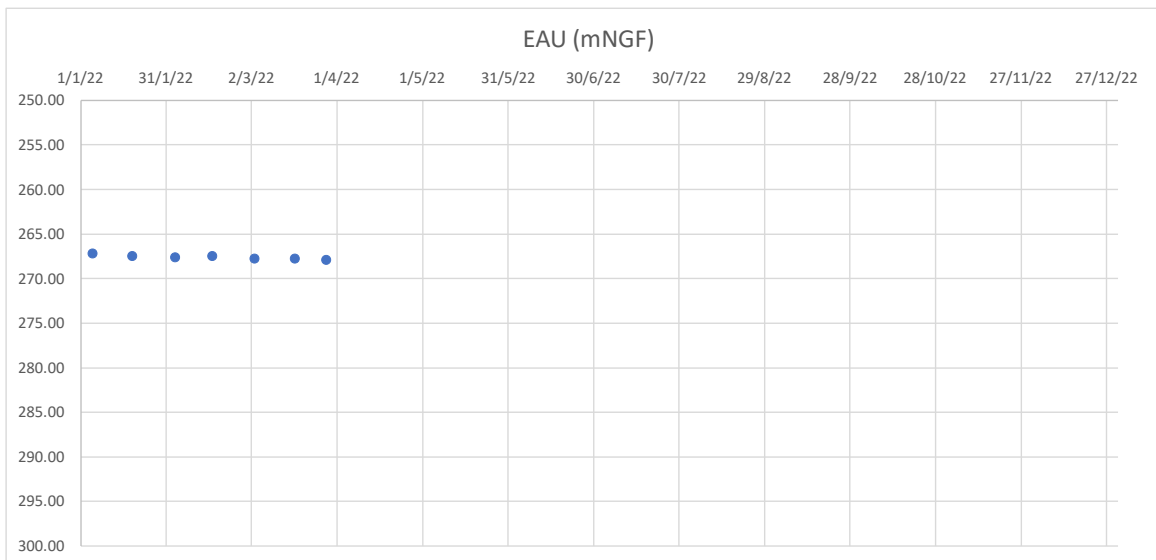




HYDROGEOTECHNIQUE CENTRE

Ingénierie géotechnique, géologique, hydrogéologique et hydrologique
appliquée aux bâtiments, génie-civil, infrastructures et à l'environnement
Sondages - Essais de sols in situ et en laboratoire

Dossier	C.21.10410
Lieu	CLERMAIN - SAINTE CECILE (71)
Projet	RCEA - Mise à 2x2 voies
Suivi piézométrique	
Sondage	PZ2
Ouvrage	Bassin BR Nord
X	1 823 795.76
Y	6 131 568.76
Z TN	261.30
Z CAPOT	262.12
Z REGARD	--

DATE	EAU (m/capot)	EAU (mNGF)	FOND (m/capot)	FOND (mNGF)
19/01/2022	1.98	260.14	10.00	252.12
03/02/2022	2.00	260.12	10.00	252.12
16/02/2022	1.89	260.23	10.00	252.12
03/03/2022	1.75	260.37	10.00	252.12
17/03/2022	1.69	260.43	10.00	252.12
28/03/2022	1.72	260.40	10.00	252.12

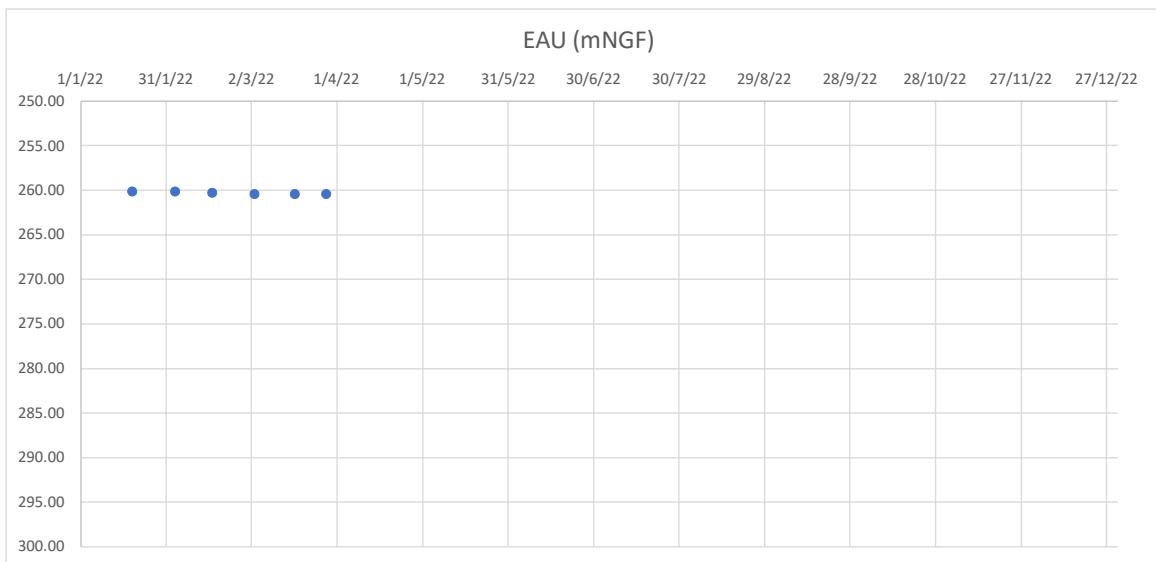



HYDROGÉOTECHNIQUE CENTRE

Ingénierie géotechnique, géologique, hydrogéologique et hydrologique
appliquée aux bâtiments, génie-civil, infrastructures et à l'environnement
Sondages - Essais de sols in situ et en laboratoire

Dossier	C.21.10410
Lieu	CLERMAIN - SAINTE CECILE (71)
Projet	RCEA - Mise à 2x2 voies
Suivi piézométrique	
Sondage	PZ3
Ouvrage	Bassin BR Nord
X	1 825 294.22
Y	6 133 727.21
Z TN	254.64
Z CAPOT	255.56
Z REGARD	254.87

DATE	EAU (m/capot)	EAU (mNGF)	FOND (m/capot)	FOND (mNGF)
05/01/2022	2.57	252.99	7.50	248.06
19/01/2022	2.78	252.78	7.50	248.06
03/02/2022	2.85	252.71	7.50	248.06
16/02/2022	2.90	252.66	7.50	248.06
03/03/2022	2.92	252.64	7.50	248.06
17/03/2022	2.98	252.58	7.50	248.06
28/03/2022	3.03	252.53	7.50	248.06

